

唐河县工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室文件

唐工改办〔2020〕8号

关于发布工程建设项目全流程审批事项和流程图的 通 知

县直有关单位：

为深入推进工程建设项目审批制度改革，切实精简审批环节，规范审批事项，压缩审批时间，市“工改”办对涉及工程建设项目全流程的审批事项，包括行政许可和技术审查、中介服务、市政公用服务以及备案等事项进一步进行了清理规范，形成了2020年工程建设项目全流程审批事项清单和审批流程图，根据《关于发布工程建设项目全流程审批事项和流程图的通知》（宛工改办〔2020〕8号）文件，现予发布。

附件：1、2020年工程建设项目全流程审批事项清单

- 2、政府投资房屋建筑类项目审批流程图
- 3、政府投资基础设施线性工程类项目审批流程图
- 4、社会投资类项目（除带方案出让用地项目及中小型社会投资项目）审批流程图
- 5、社会投资带方案出让类项目审批流程图
- 6、社会投资中小型工程项目审批流程图
- 7、水利工程类项目审批流程图
- 8、公路、水运工程类项目审批流程图
- 9、35-500 千伏电网工程建设项目审批流程图



附件 1:


2020 年工程建设项目全流程审批事项清单

序号	事项名称
1	企业投资项目核准
2	企业投资项目备案
3	政府投资项目可行性研究报告审批
4	政府投资项目建议书审批
5	节能审查
6	政府投资项目初步设计及概算审批
7	建设项目选址意见书核发和建设项目用地预审
8	乡村建设规划许可证核发
9	建设用地（含临时用地）规划许可证核发
10	建设工程规划类许可证核发
11	划拨国有建设用地使用权审核
12	规划条件核实
13	建设用地检查核验
14	建设工程消防设计审查
15	建筑工程施工许可核准
16	建设工程消防验收或备案
17	房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案
18	城镇排水与污水处理设施竣工验收备案

19	燃气设施工程竣工验收备案
20	公路建设项目施工许可
21	水运工程设计文件审查
22	公路建设项目设计审批
23	公路建设项目竣工验收
24	水运建设项目竣工验收
25	生产、存储危险化学品建设项目安全条件审查
26	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查
27	洪水影响评价审批
28	生产建设项目水土保持方案审批
29	水利工程建设项目竣工验收
30	河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批
31	建设工程文物保护和考古许可
32	涉及国家安全事项的建设项目审批
33	建设项目环境影响评价审批
34	入河排污口的设置和扩大审核
35	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批
36	雷电防护装置设计审核
37	雷电防护装置竣工验收
38	防空地下室建设审查批准
39	人防工程竣工验收备案

40	市政设施建设类审批
41	工程建设涉及城市绿地、树木审批
42	因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核
43	城镇污水排入排水管网许可
44	规划设计方案联合审查
45	建设工程城建档案验收
46	取水许可
47	水利工程开工报告备案
48	供电报装
49	燃气用户报装
50	供热用户报装
51	广播电视报装
52	通信报装
53	供水用户报装
54	地质灾害危险性评估
55	地震安全性评价
56	建设项目安全评价
57	雷电防护装置检测
58	施工图设计文件审查

附件 2：政府投资房屋建筑类项目审批流程图（控制在 53 个工作日内）

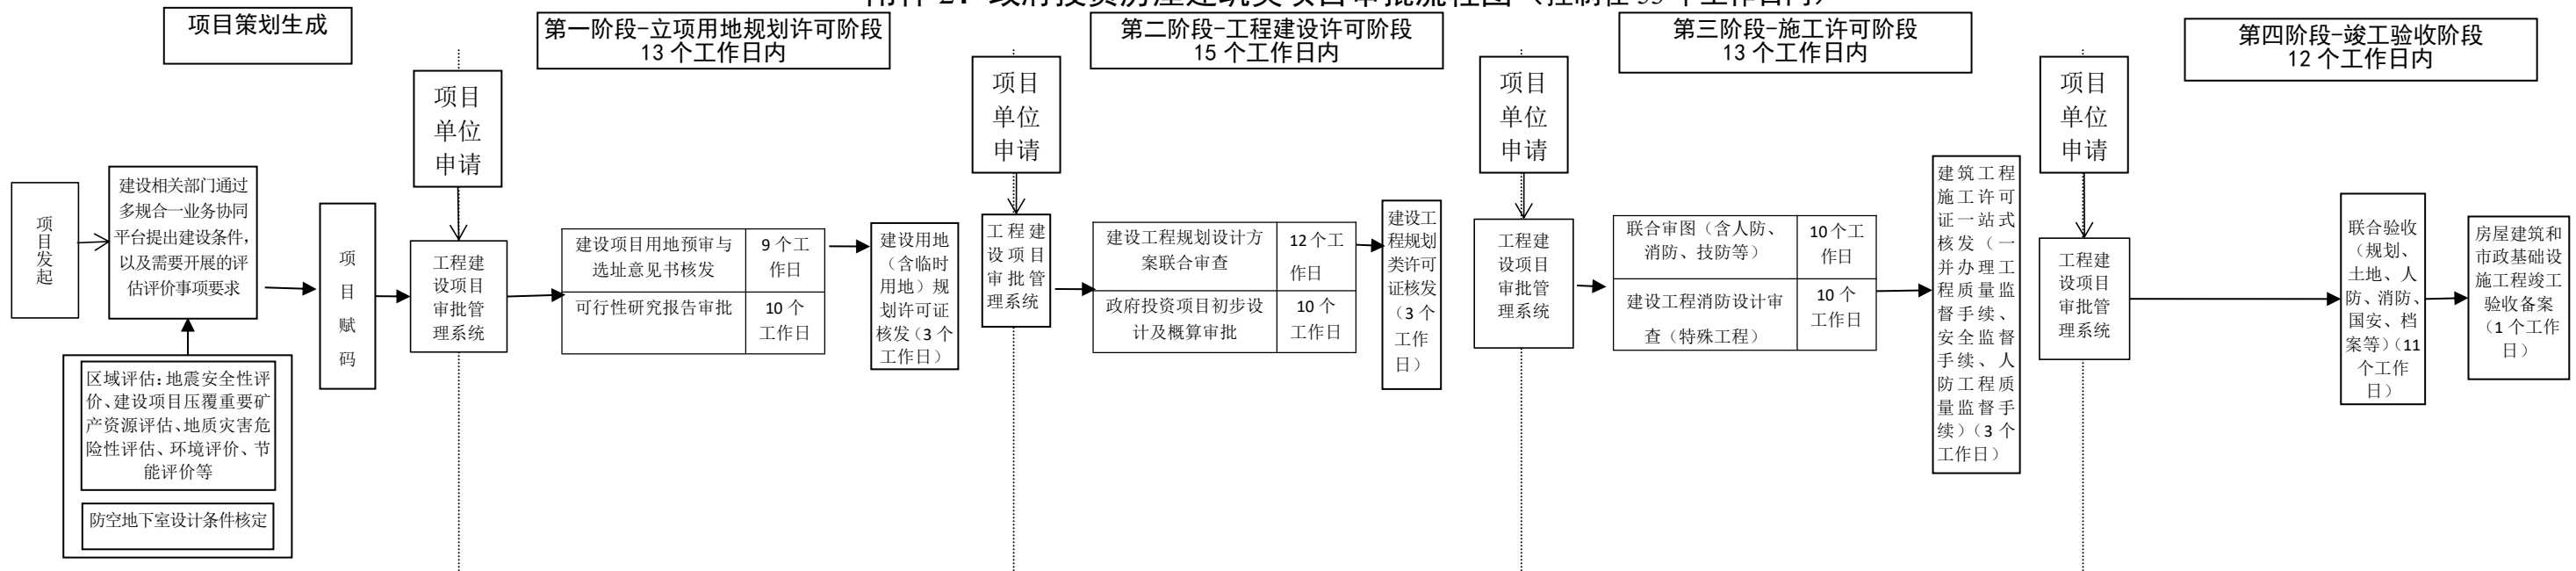

第一阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批(立项用地规划许可阶段)	5个工作日
政府投资项目建议书审批	10个工作日

第二阶段可并联或并行办理其他事项

涉及国家安全事项的建设项目审批(工程建设许可阶段)	5个工作日
乡村建设规划许可证核发	5个工作日

第三阶段可并联或并行办理其他事项

市政设施建设类审批	6个工作日
工程建设涉及城市绿地、树木审批	5个工作日
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核	10个工作日
城镇污水排入排水管网许可	6个工作日
河道管理范围内有关活动(不含河道采砂)审批	10个工作日

第四阶段可并联或并行办理其他事项

市政公用设施接入(供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等)


第二、三阶段可并联或并行办理事项

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批	5个工作日
市政公用设施报装(供水、供电、供热、燃气、广播电视、通信等)	


第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

划拨国有建设用地使用权审核 (10个工作日)	建设工程文物保护和考古许可 (10个工作日)	建设项目环境影响评价审批(编制报告书 20个工作日, 编制报告表 10个工作日)	取水许可 (10个工作日)
建设项目使用林地审(核)批 (10个工作日)	生产建设项目水土保持方案审批 (10个工作日)	新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 (20个工作日)	入河排污口的设置和扩大审核 (10个工作日)
地震安全性评价 (15个工作日(不含野外施工))			


附件 3：政府投资基础设施线性工程类项目审批流程图(控制在 53 个工作日内)

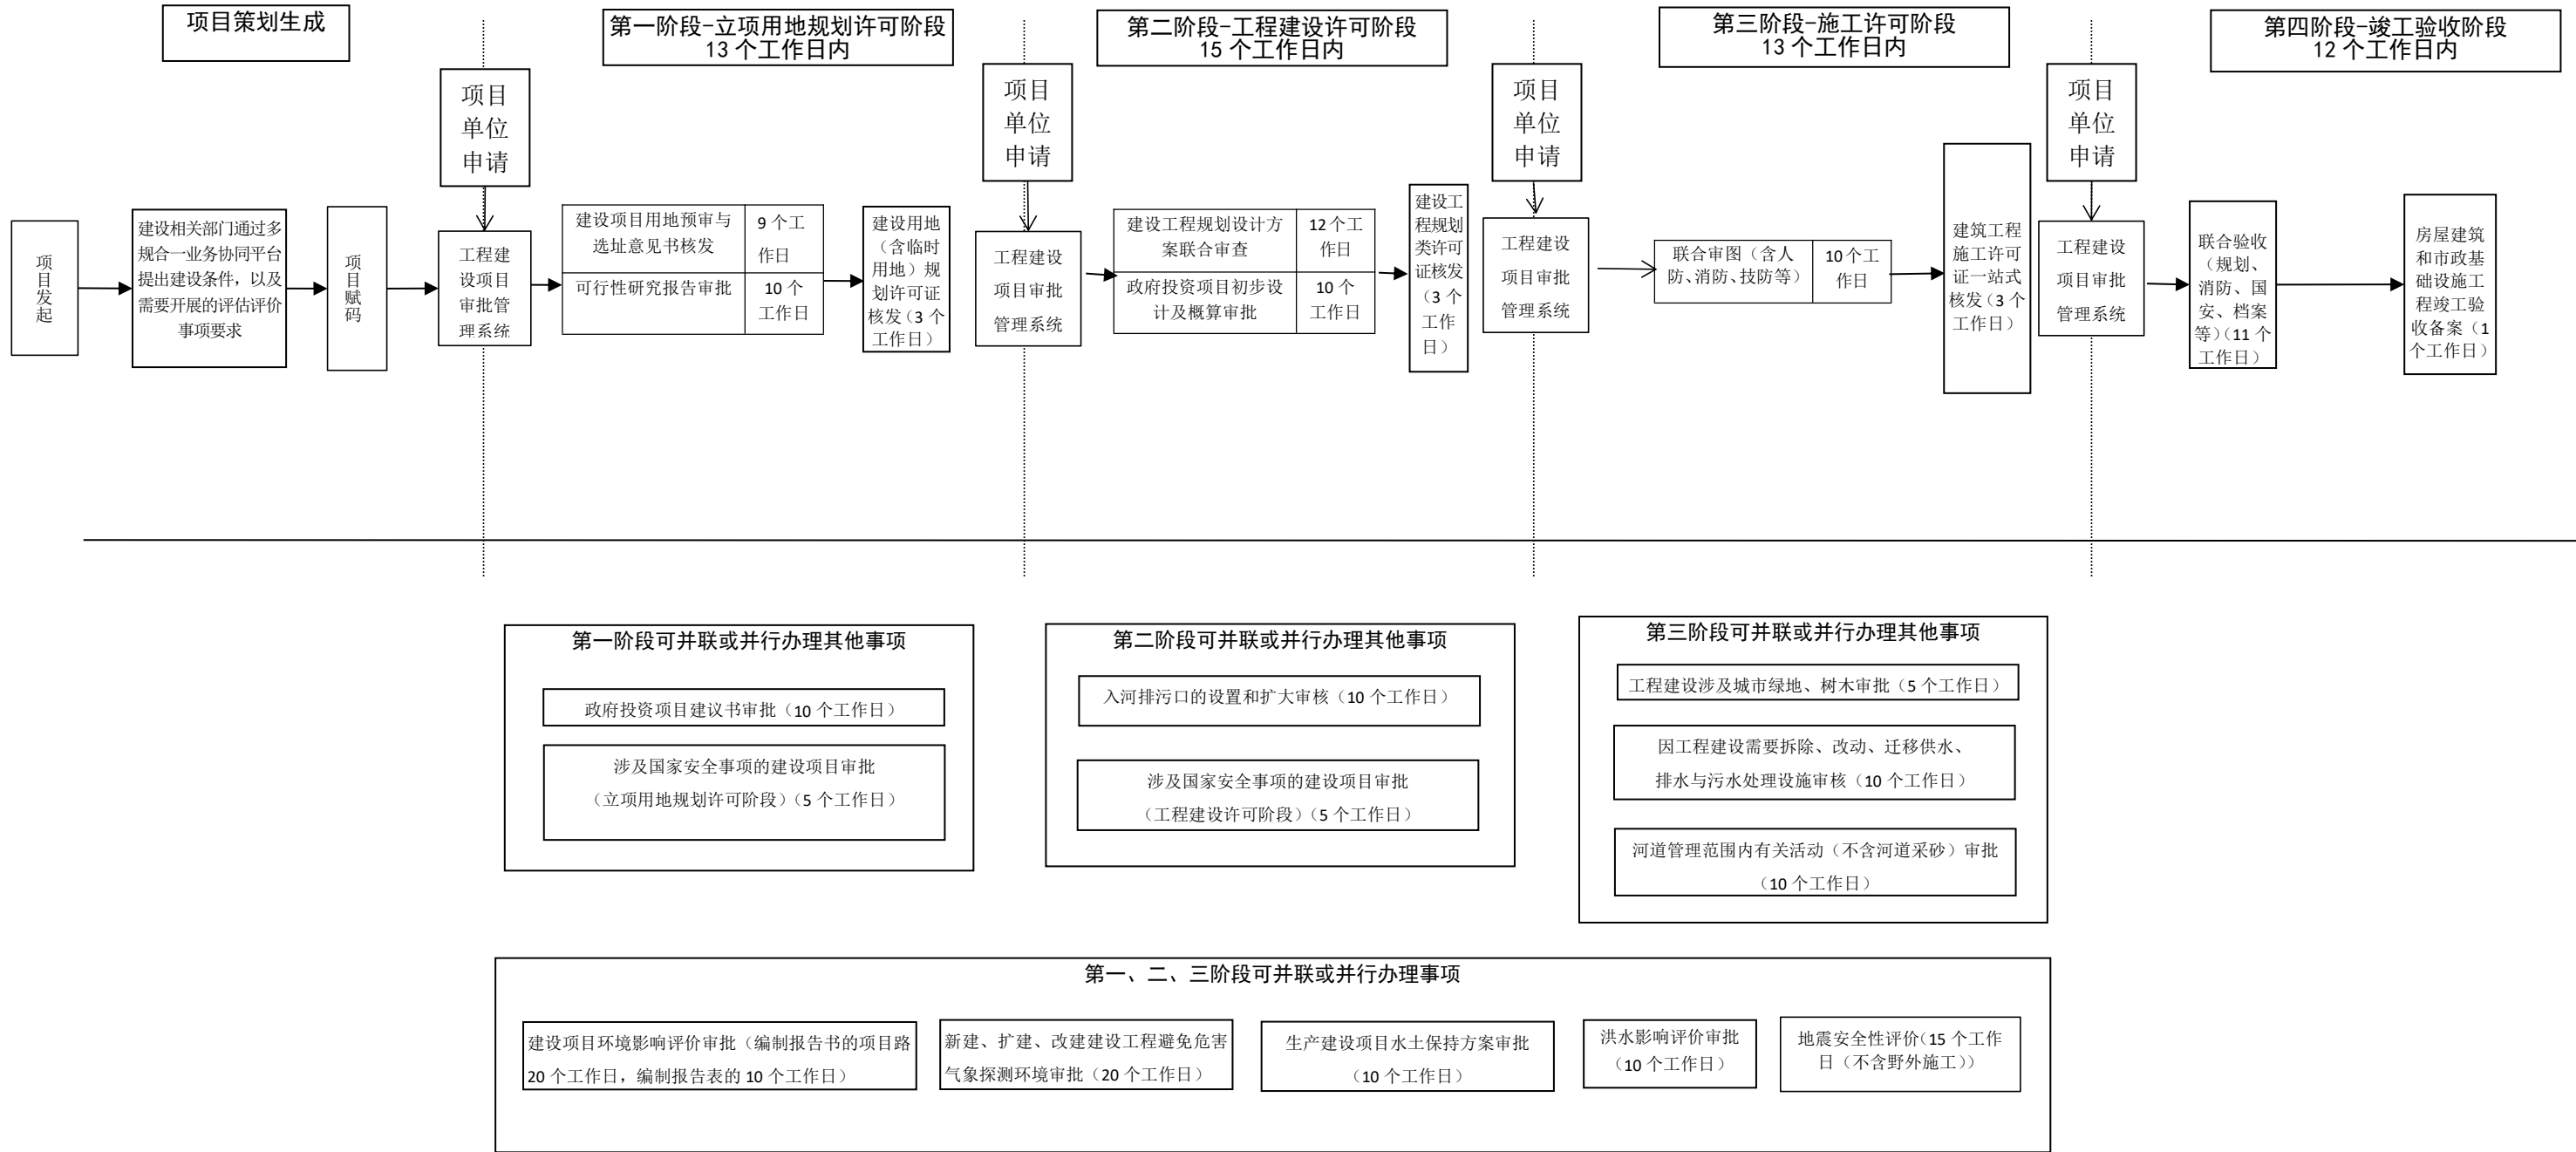


附件 4：社会投资类项目（除带方案出让用地项目及中小型社会投资项目）审批流程图（控制在 53 个工作日内）

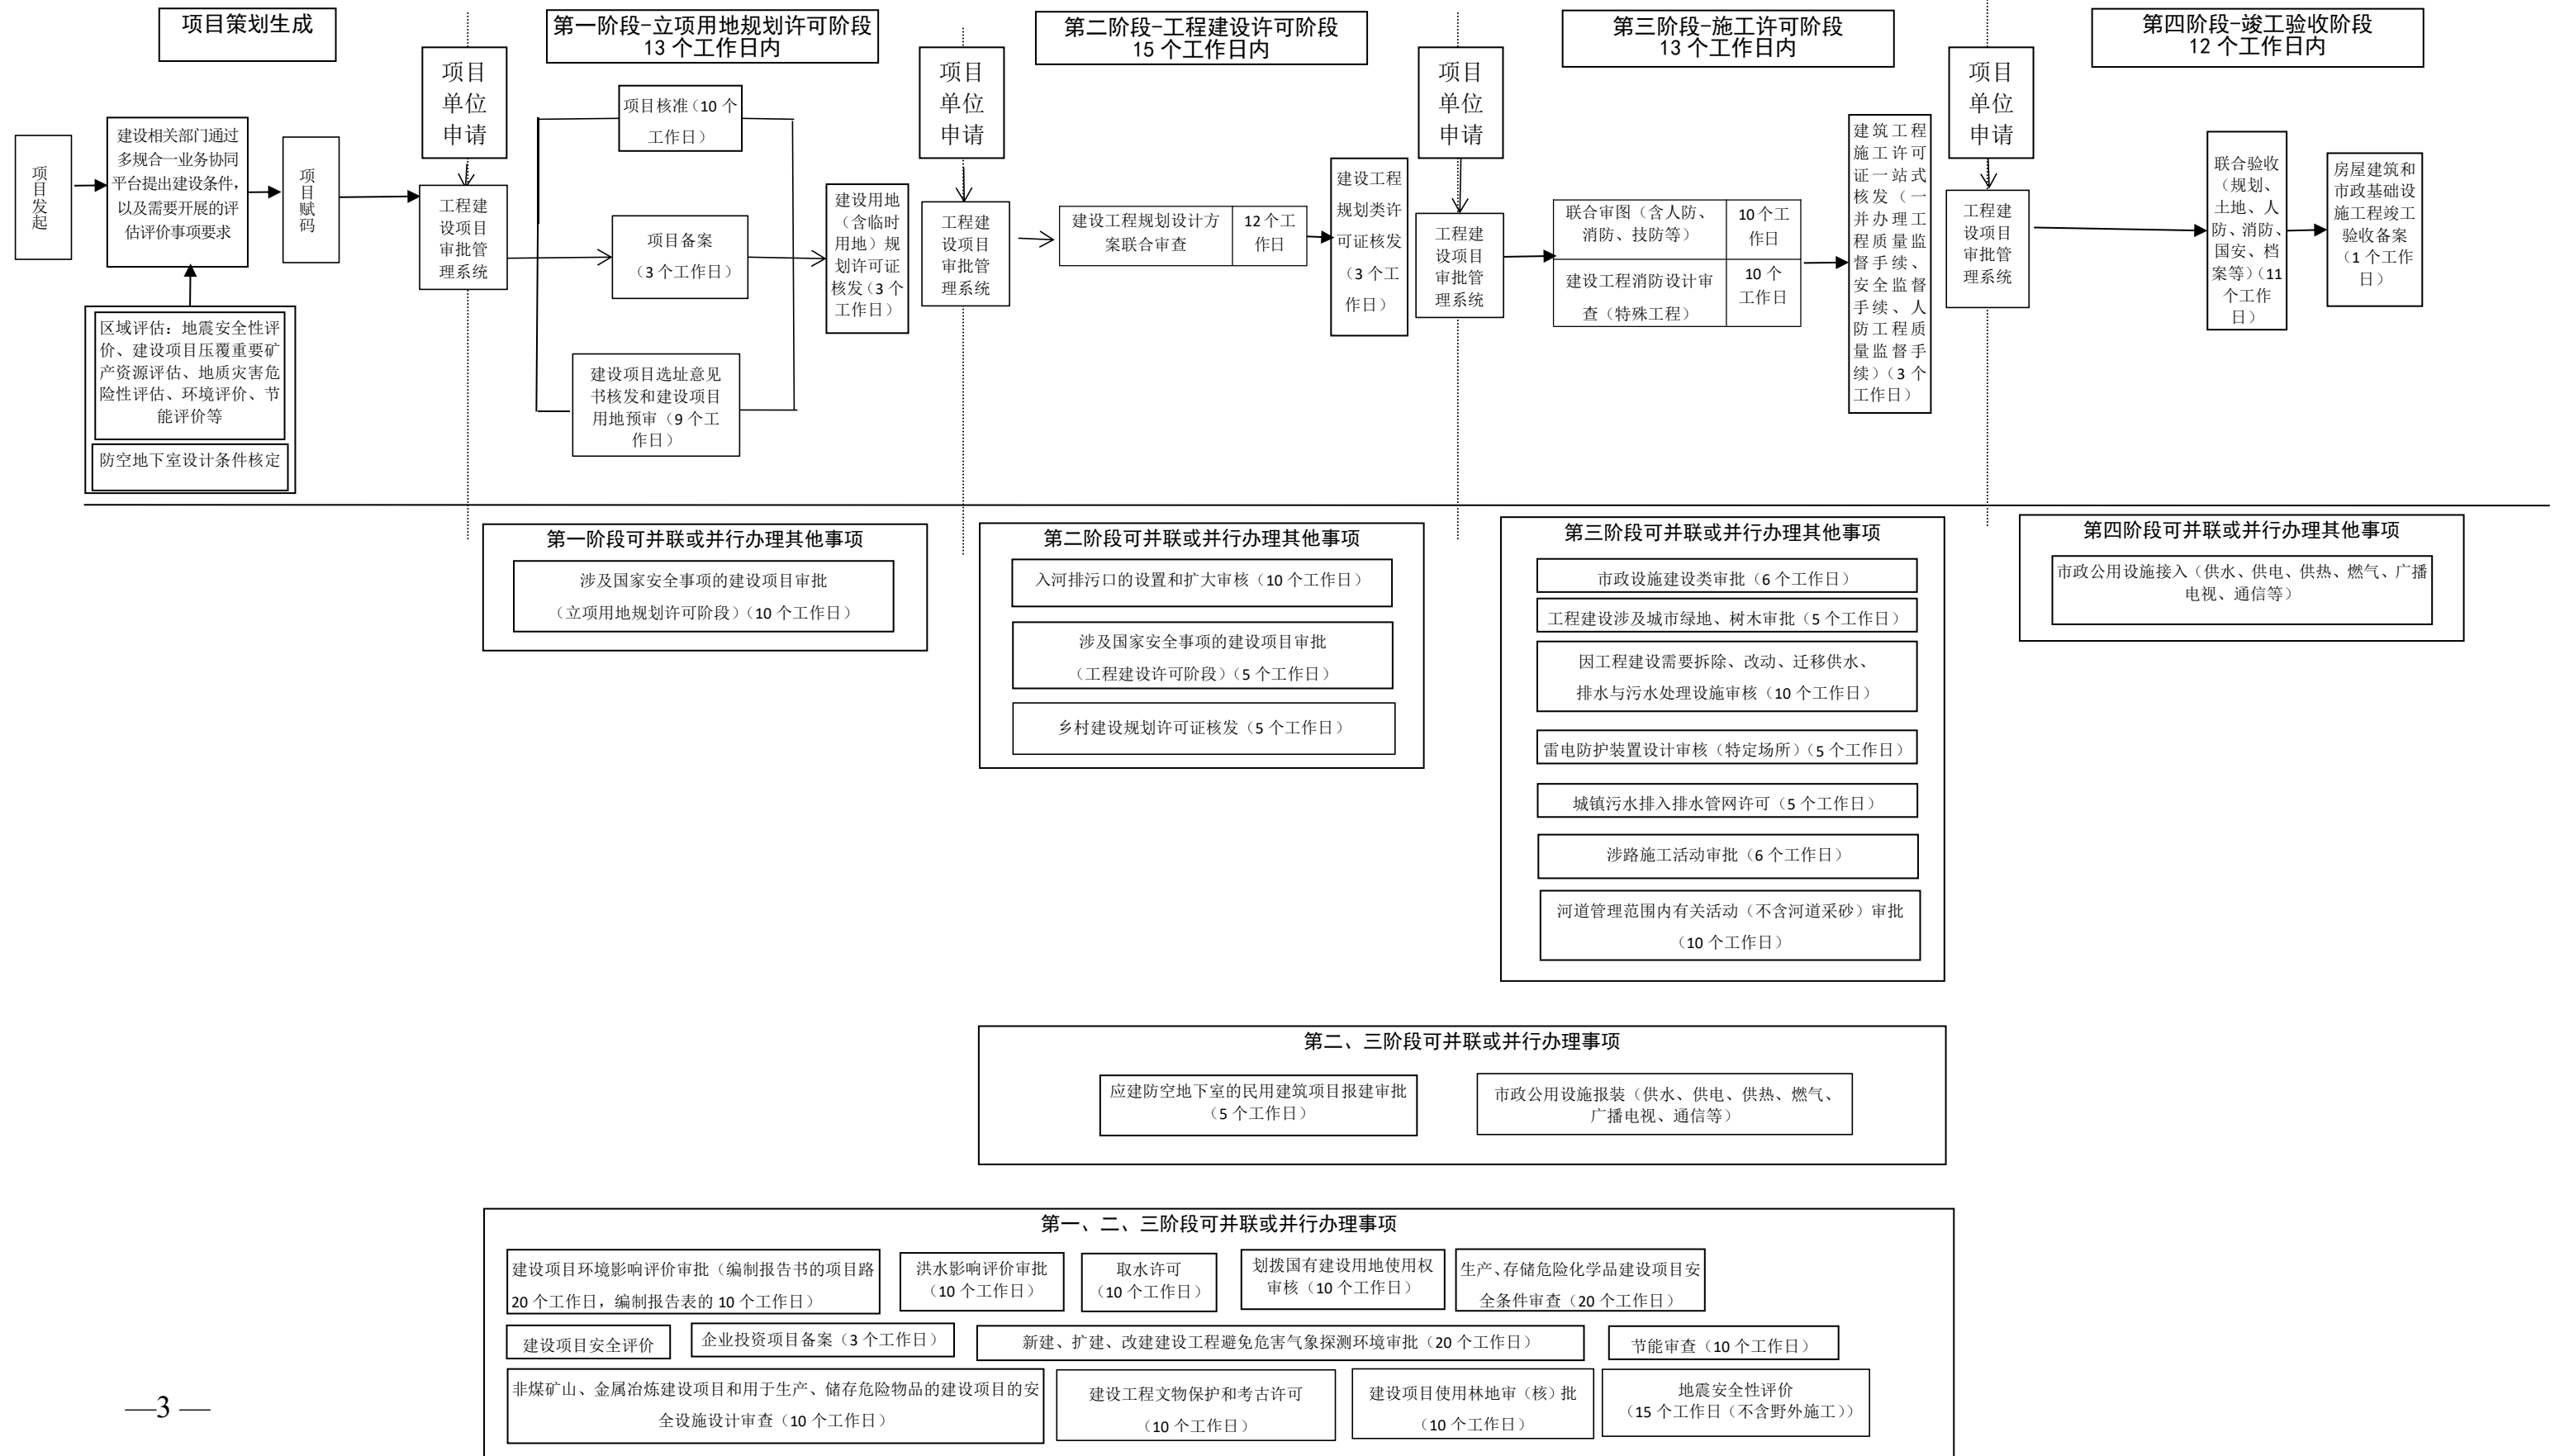


附件 5：社会投资带方案出让类项目审批流程图（控制在 40 个工作日内）

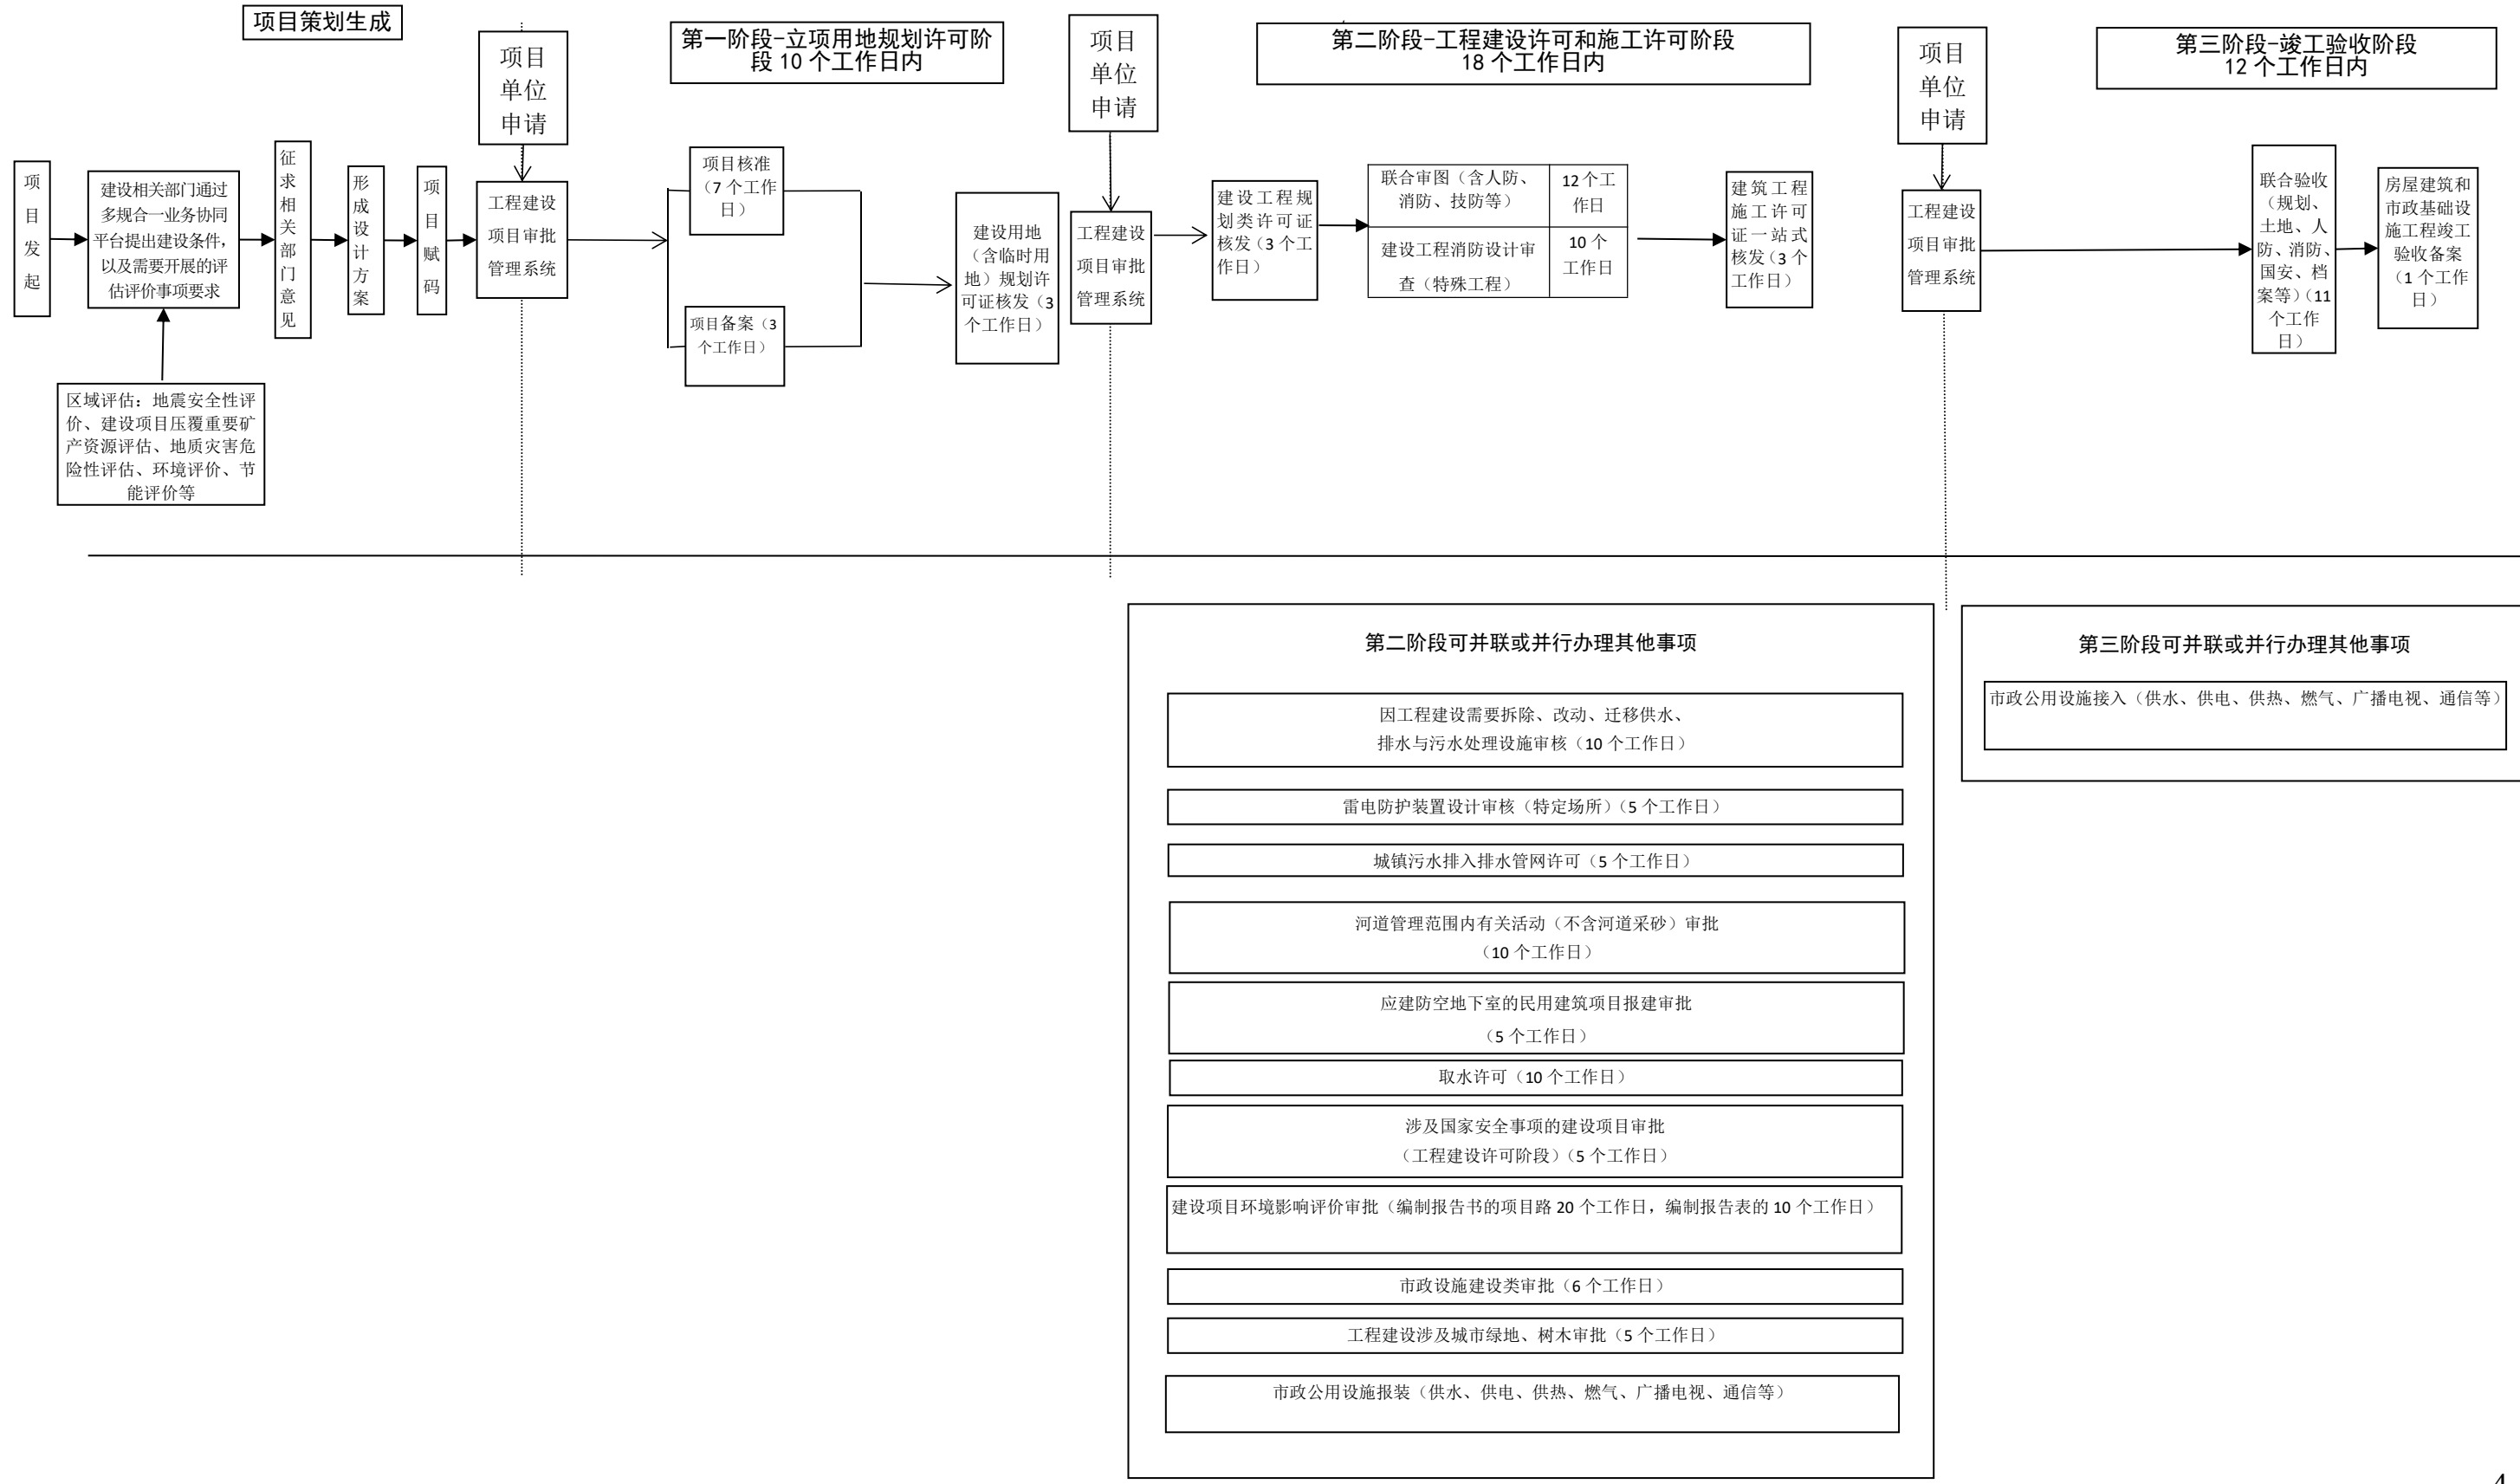


附件 6：社会投资中小型工程项目审批流程图（控制在 52 个工作日内）

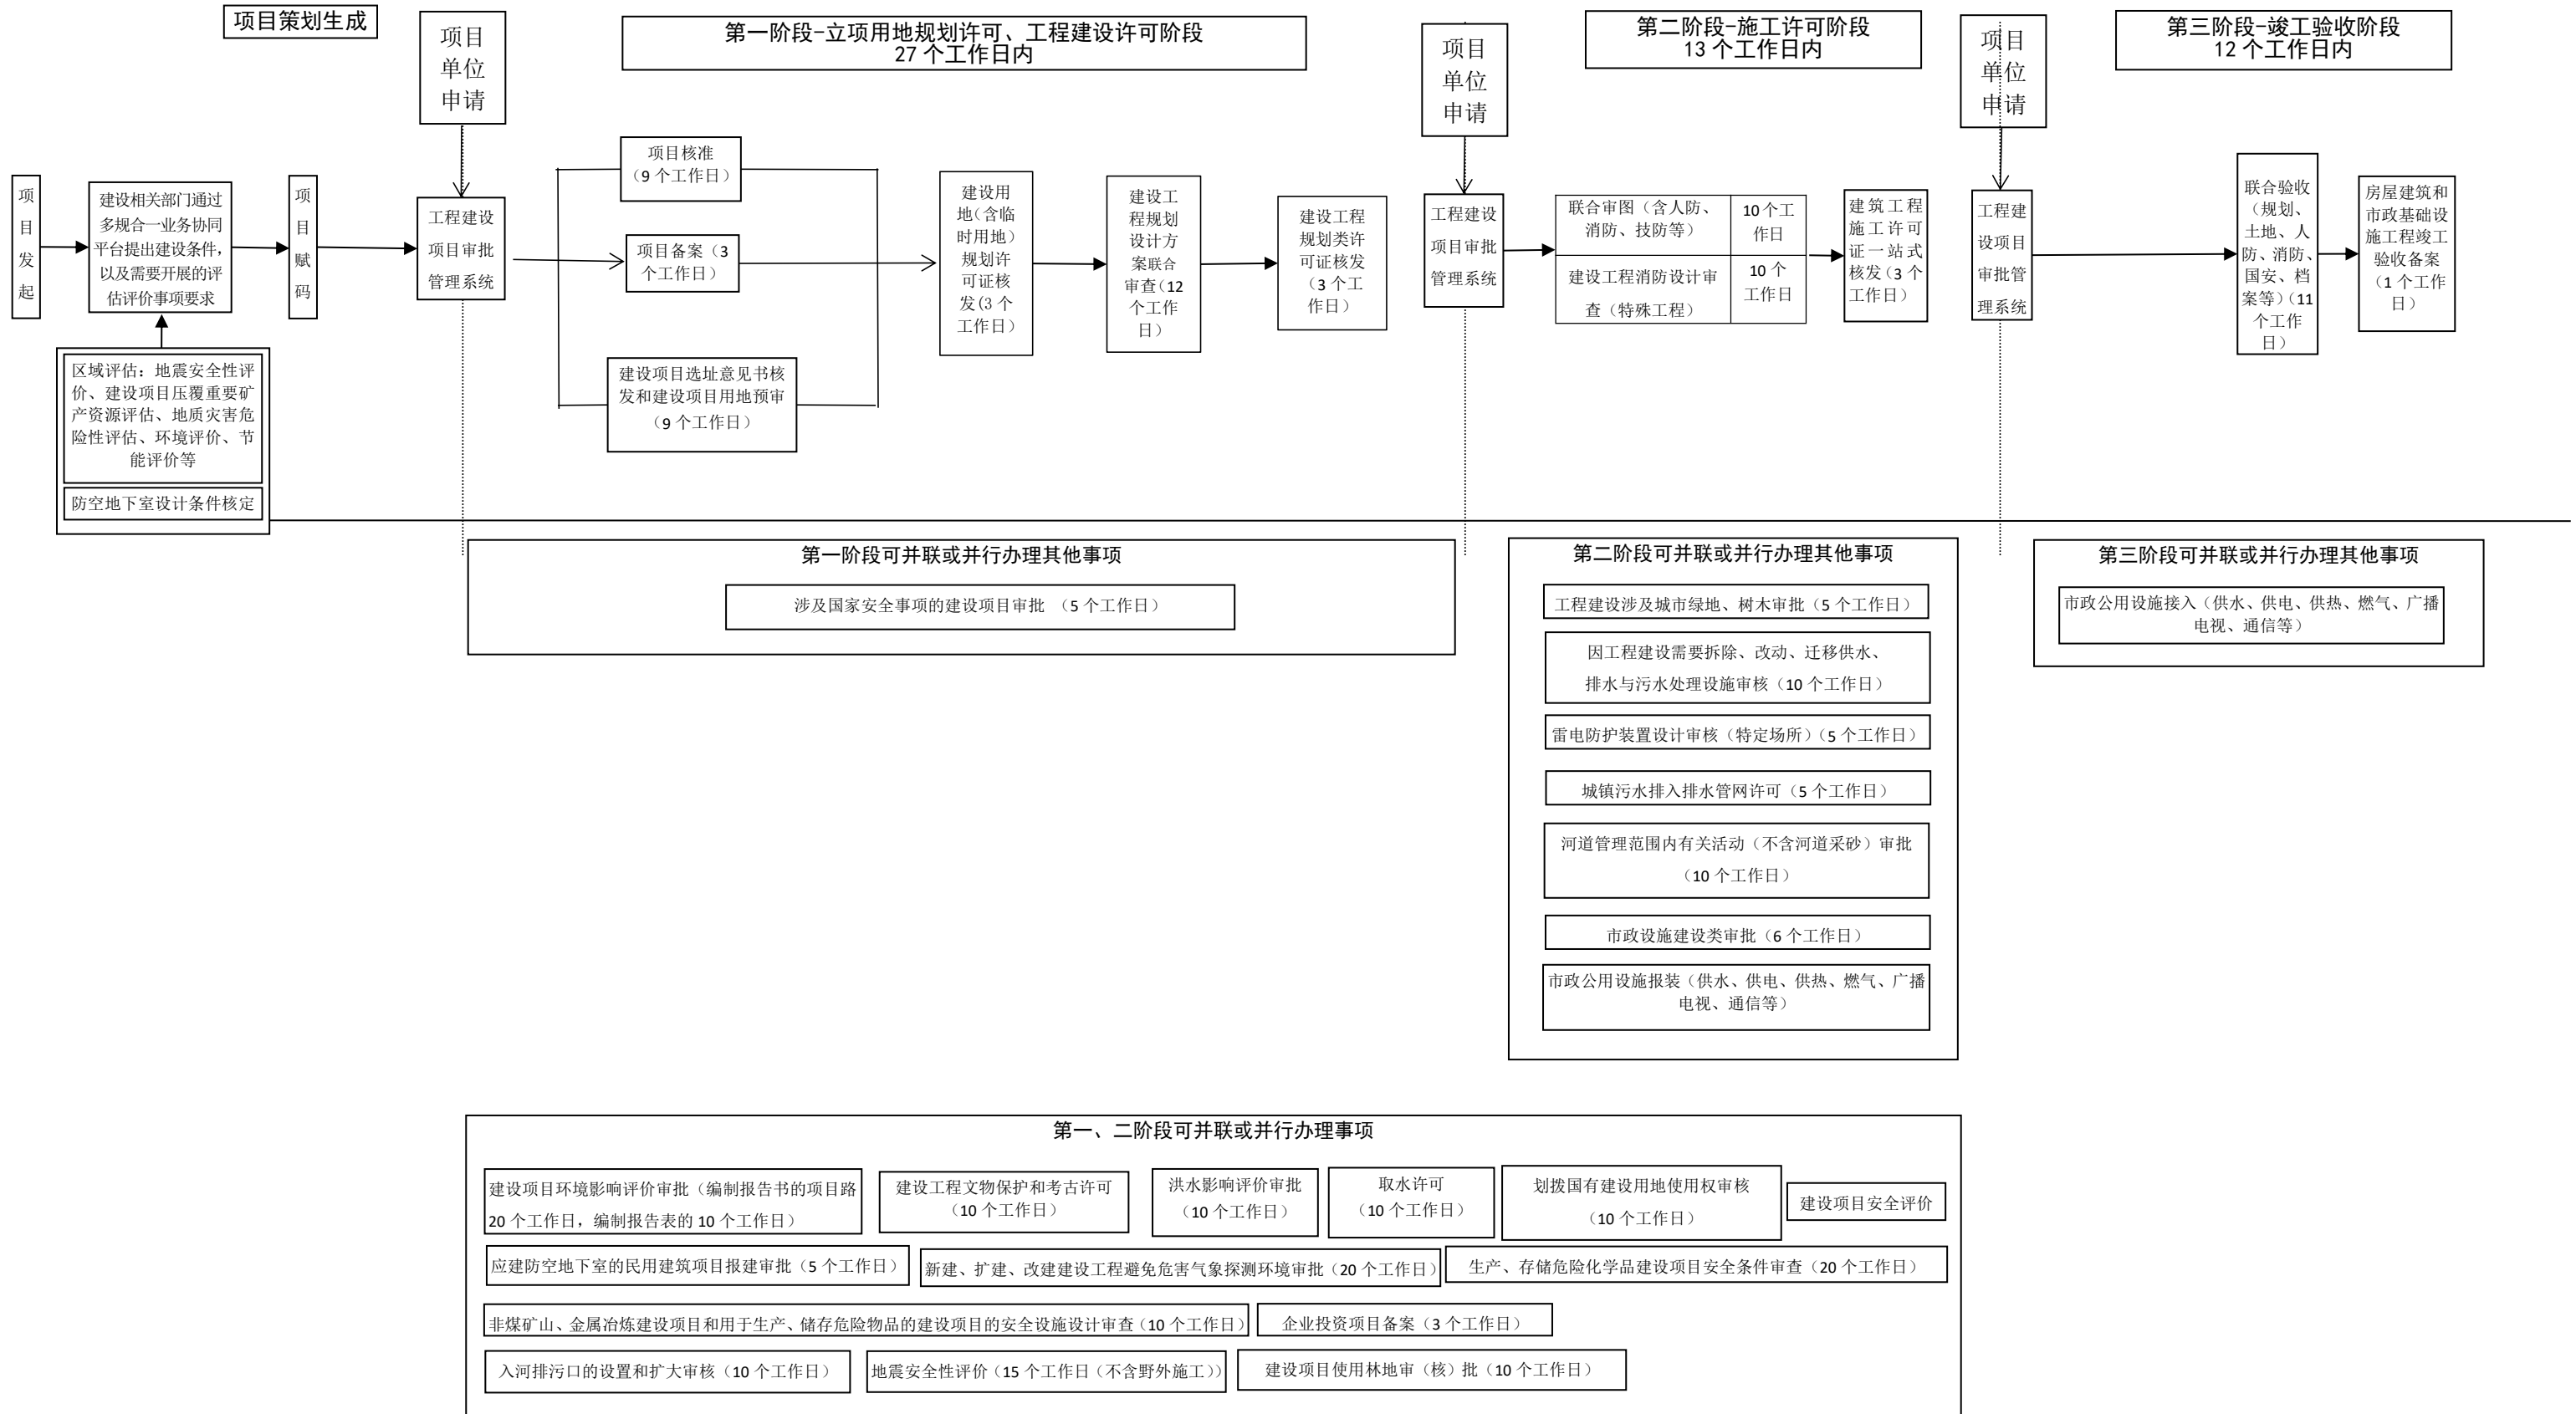

附件 7：水利工程类项目审批流程图（控制在 35 个工作日内）

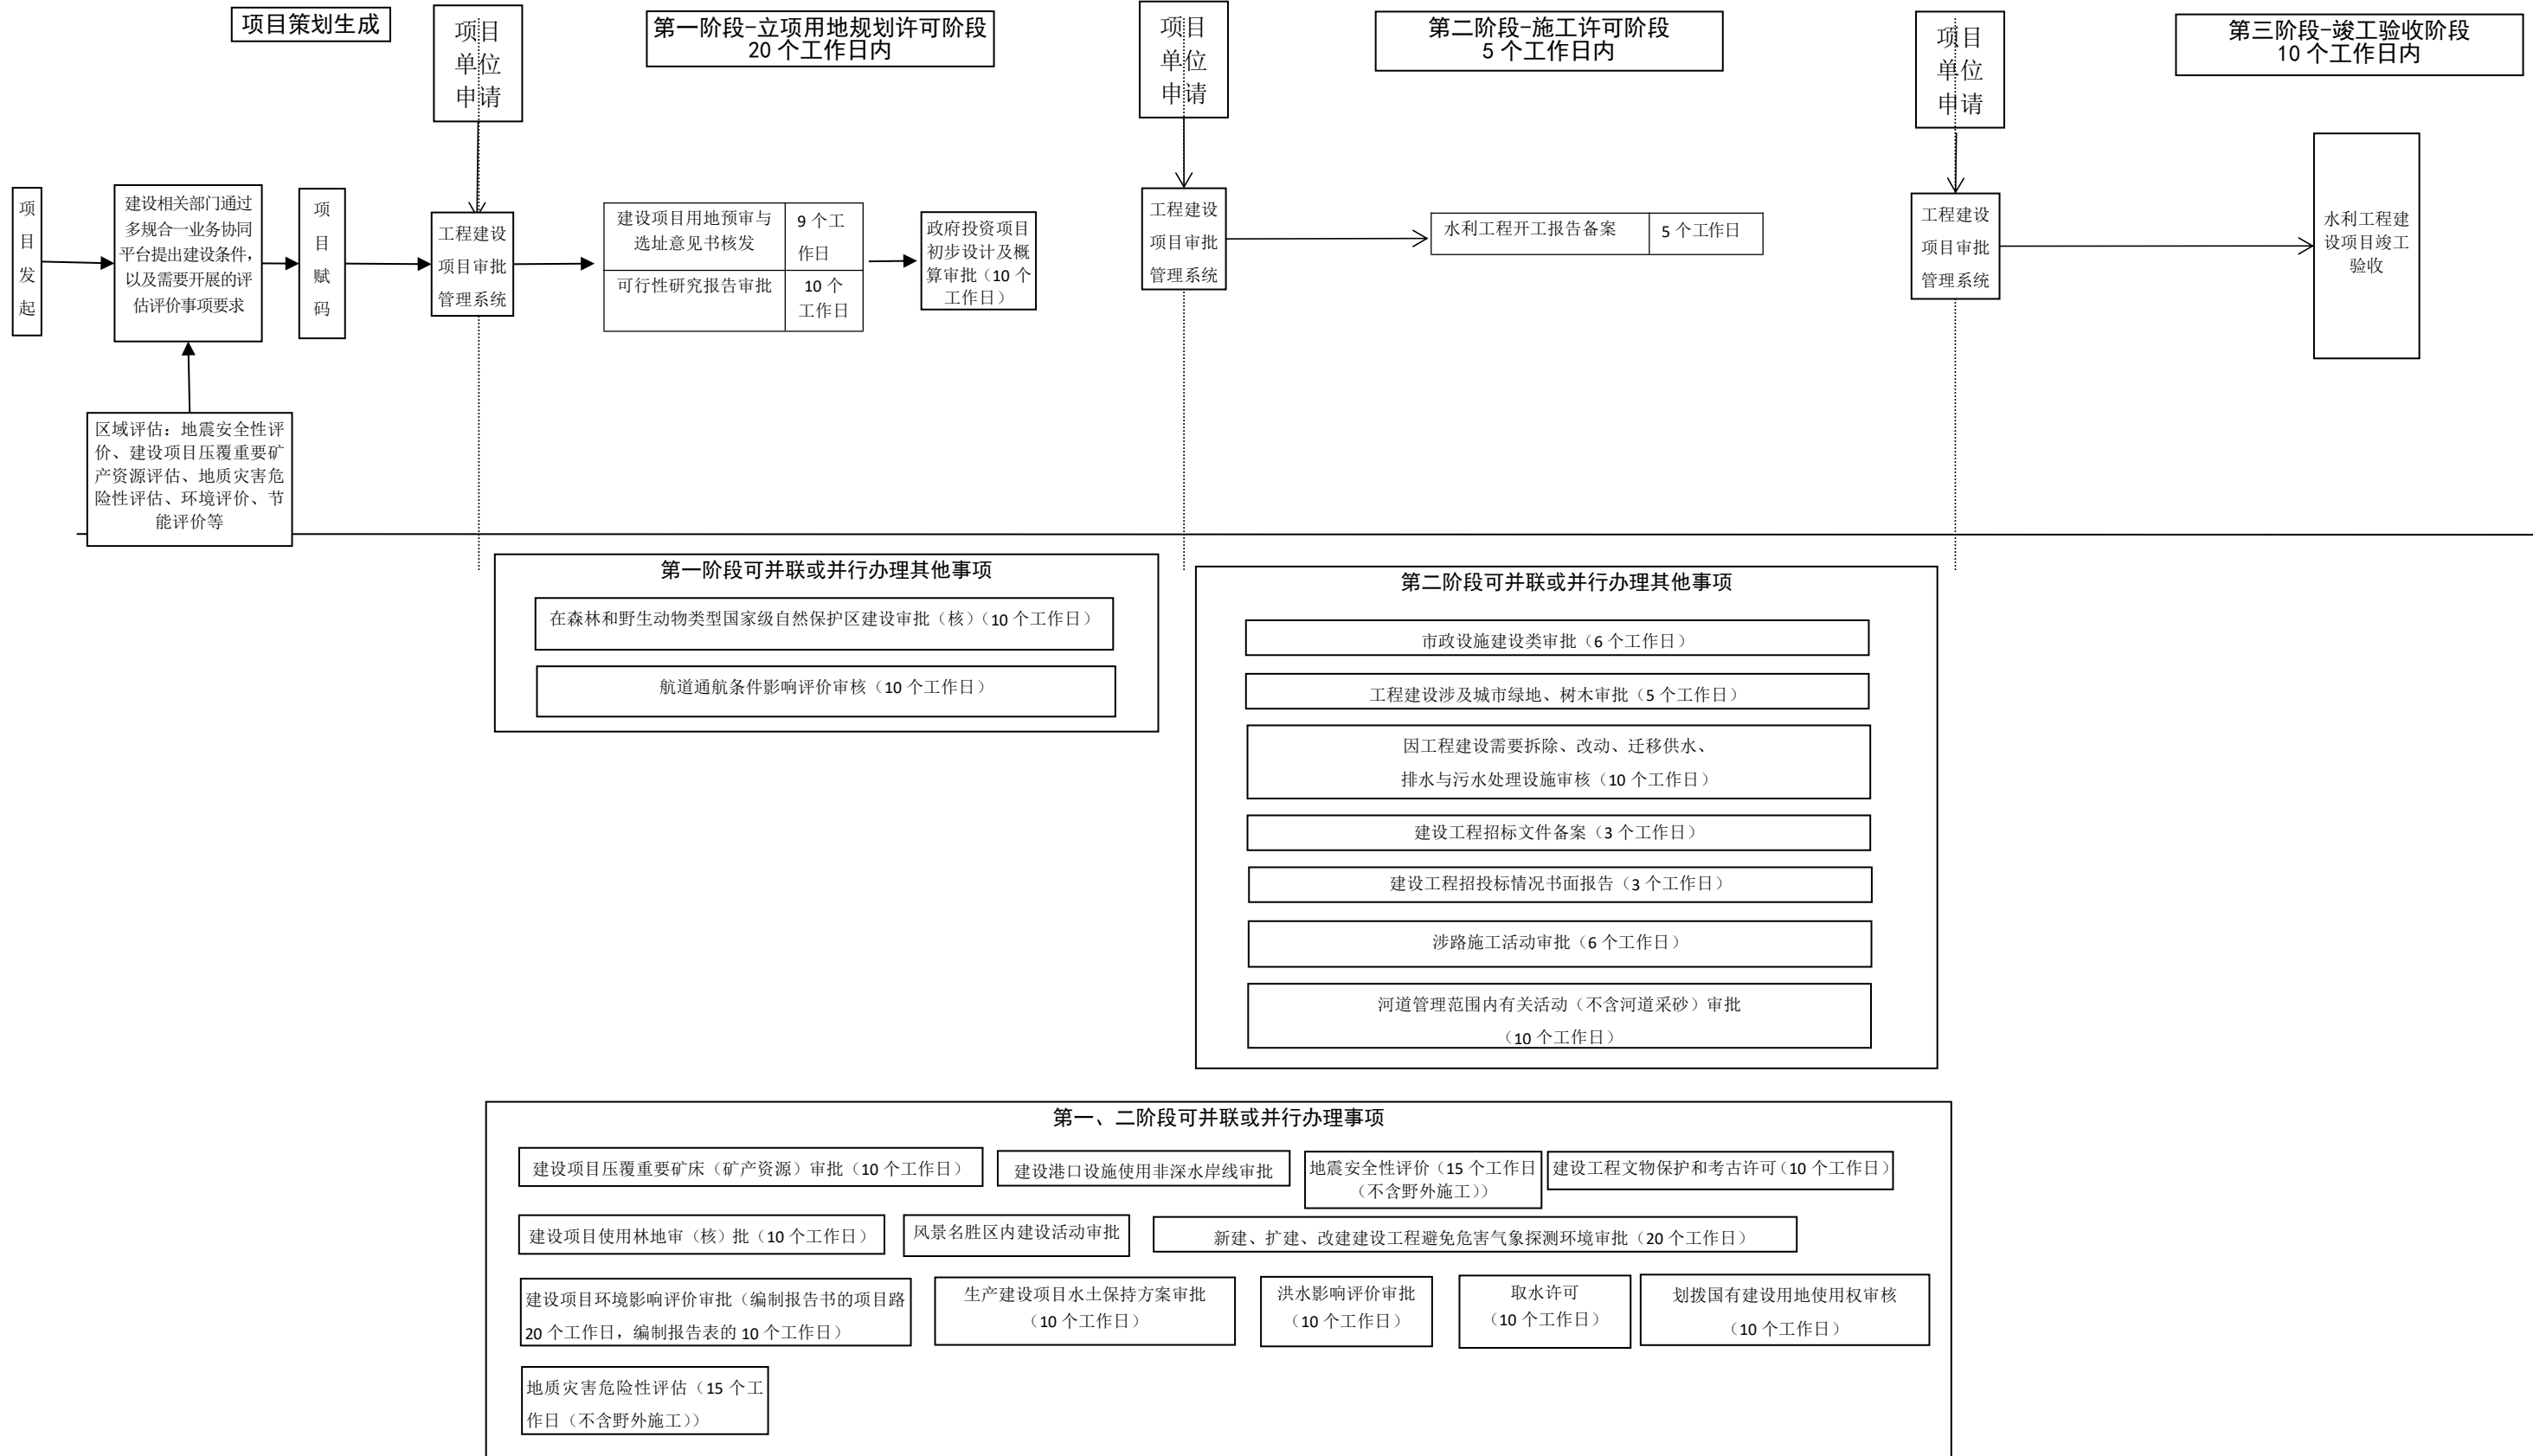

附件 8：公路、水运工程类项目审批流程图（控制在 53 个工作日内）

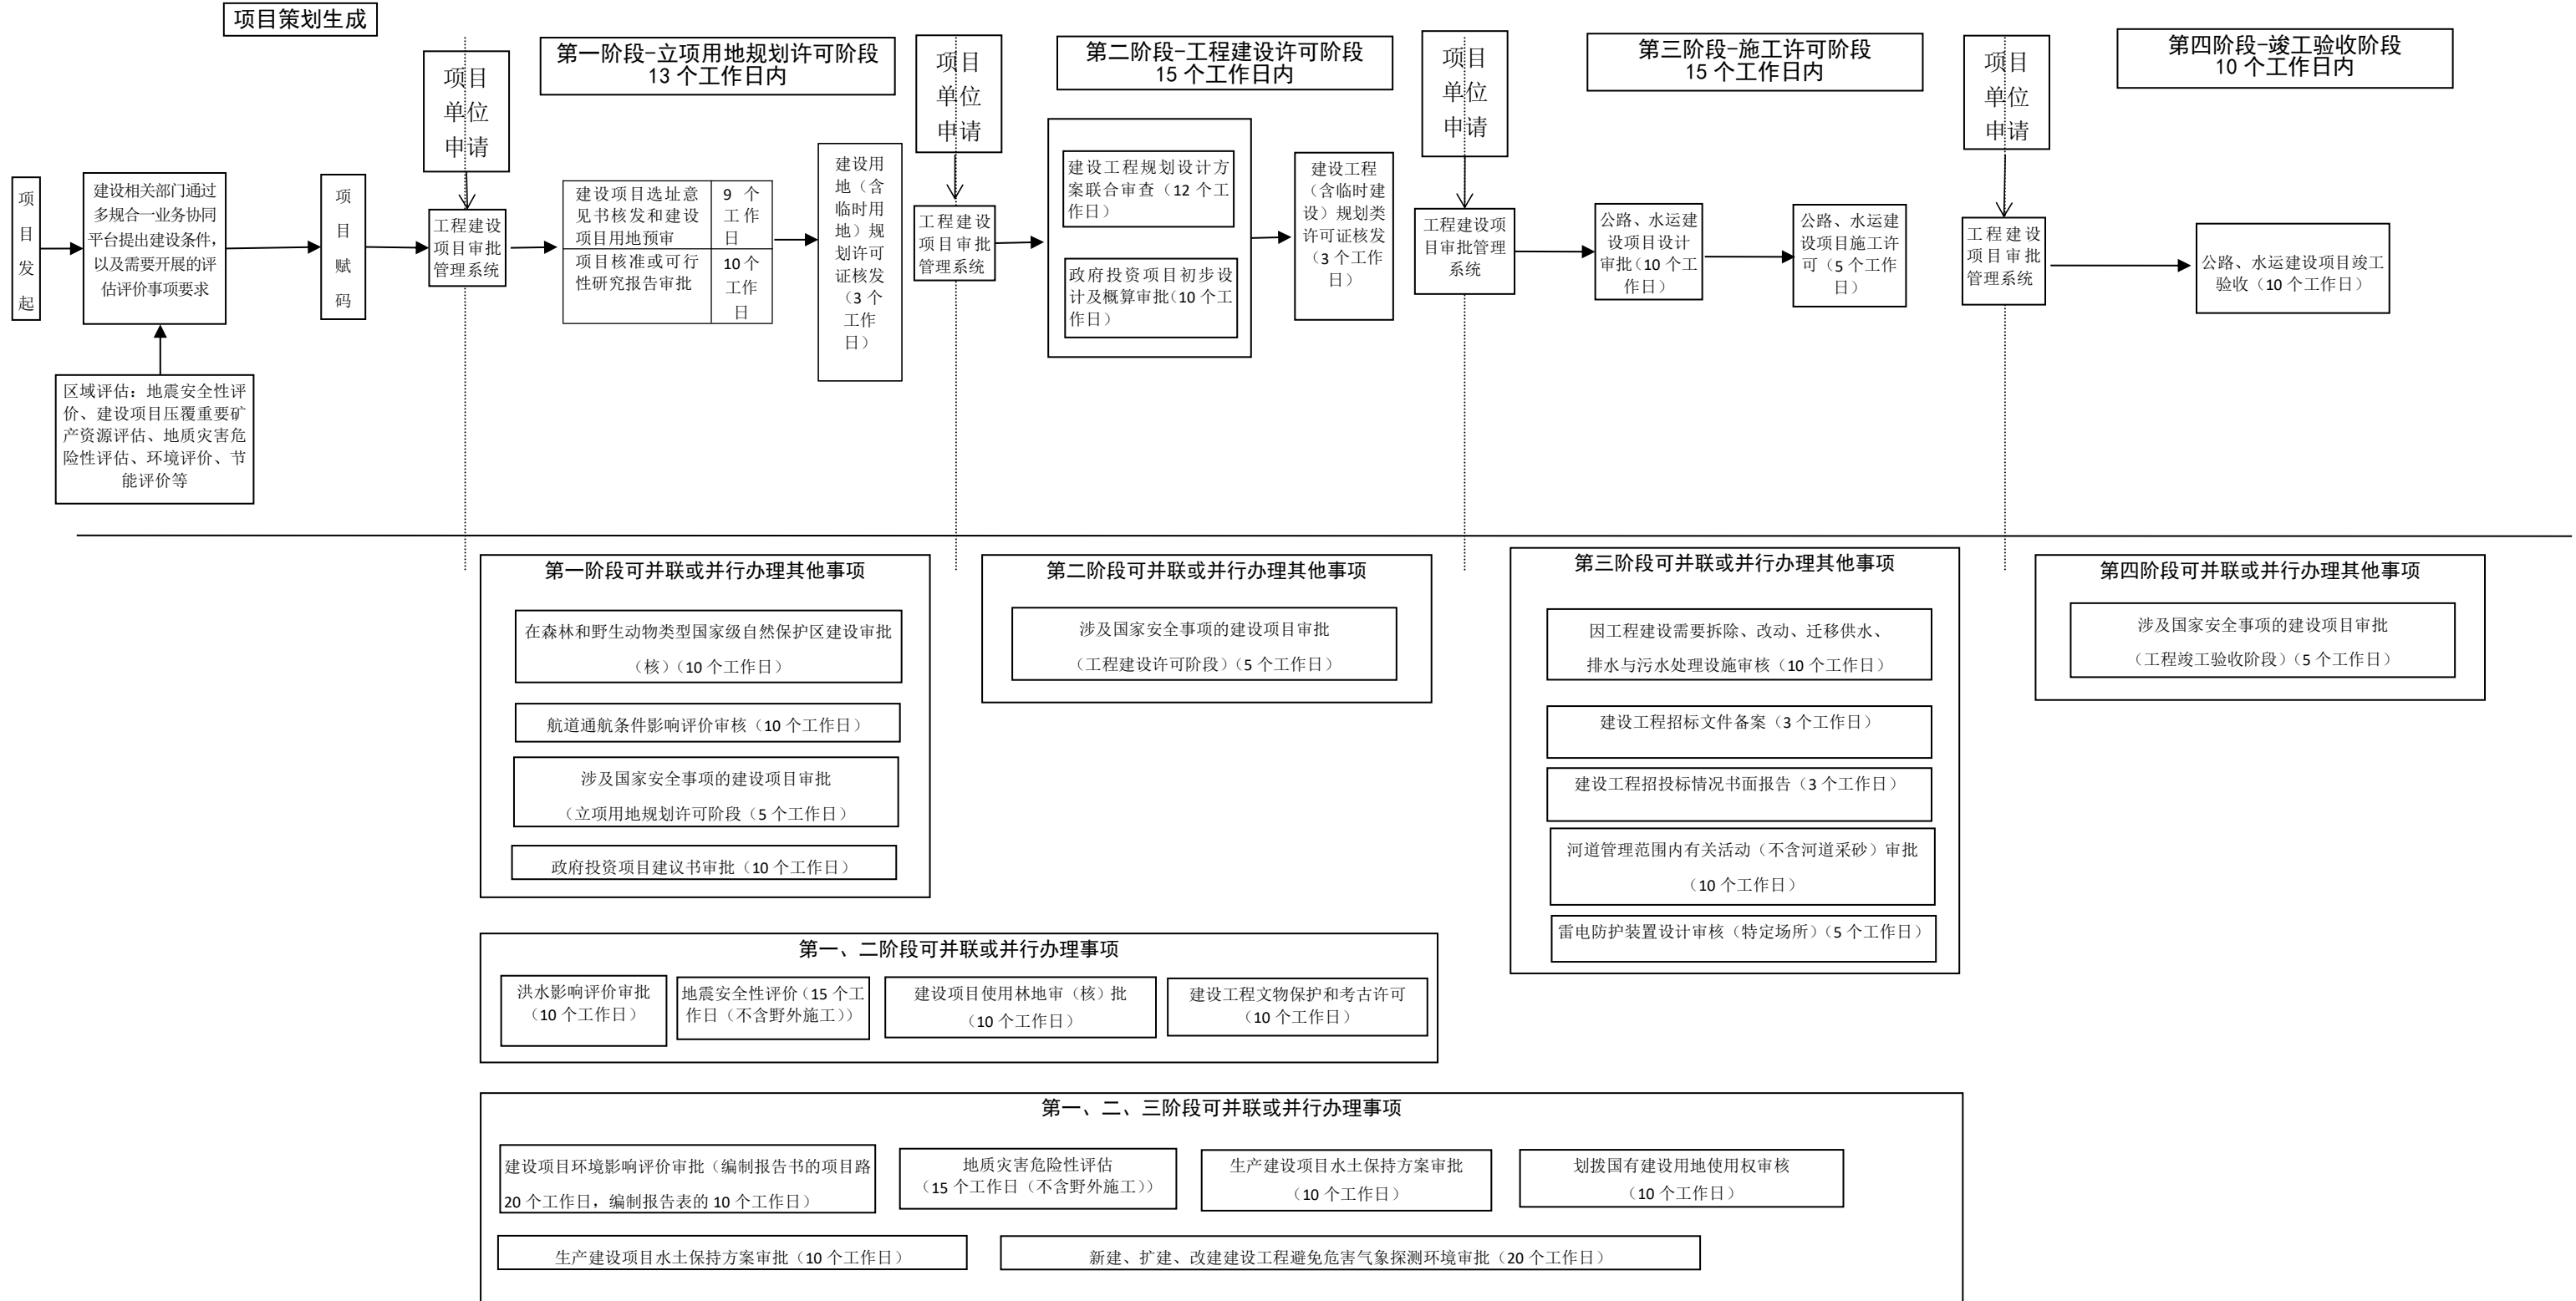

附件 9：35-500 千伏电网工程建设项目审批流程图（控制在 41 个工作日内）

